


PREFAB DAKSYSTEMEN

BOUW DECK



Dick de BouwDecker

**Veilig en efficiënt
samenwerken op de
bouwplaats**

PREFAB DAKSYSTEMEN

**BOUW
DECK**



Veilig en efficiënt samenwerken op de bouwplaats

Met grote zorg en aandacht hebben wij voor onze opdrachtgevers en alle betrokkenen* dit boekje samengesteld.

Dick de BouwDecker geeft in elke fase van de bouw aanwijzingen om op de juiste manier zo veilig en efficiënt mogelijk samen te kunnen werken op de bouwplaats met de dakelementen van BouwDeck.


* Uitvoerder - Montageploeg - Steigerbouwer -
Stelleur - Metselaar.



Plaats de steiger juist en goed bij het casco

Steigerbouwer; Zorg ervoor dat de eerste slag en het gebruikte steiger-materiaal **1** goedgekeurd is en


dat de steiger op een juiste en veilige manier is geplaatst rondom het casco. Pas dan kan de montageploeg of onze BouwDeckers aan de slag!

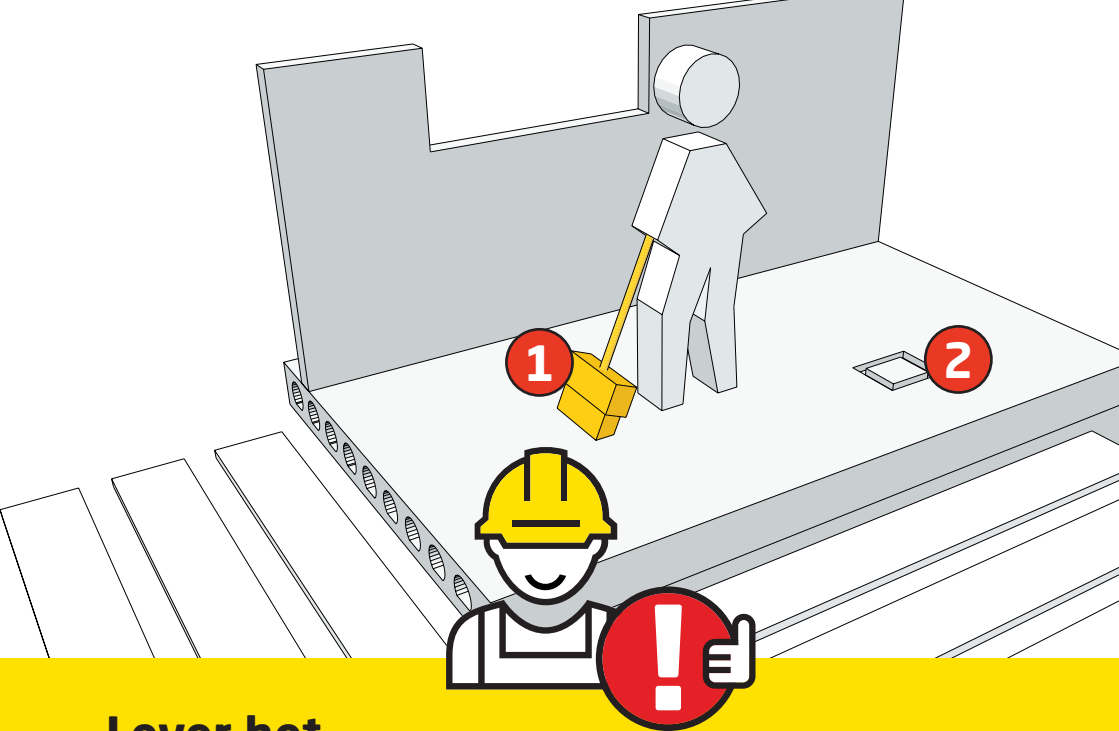

Lever het casco leeg en schoon op

Uitvoerder; Voor het plaatsen van de BouwDeck dakelementen moet de bovenzijde van het casco **1** geheel leeg

en aangeveegd zijn, ook plassen met water moeten verwijderd worden. Spelingen bij centraaldozen **2** in de onderconstructie moeten luchtdicht afgewerkt zijn.

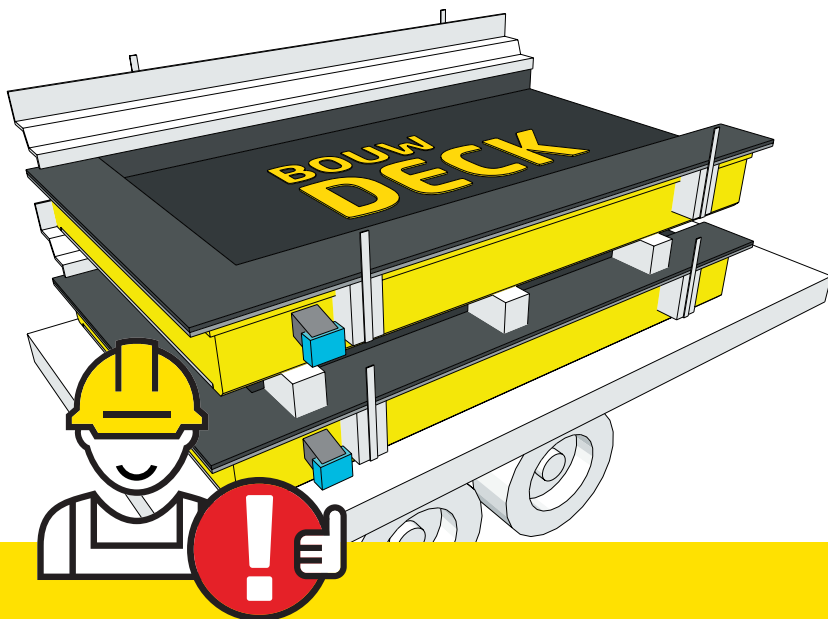


Aanleveren van de dakelementen op de bouwplaats

Uitvoerder; Op de afgesproken dag en tijd komt de trailer met onze BouwDeck dakelementen op de bouwplaats aan.

Zorg ervoor dat de dakelementen direct per dakelement verticaal van de trailer kunnen worden afgeladen.

Als onze BouwDeckers de dakelementen plaatsen dan moet de uitvoerder om 9.30 uur een hijskraan ter beschikking stellen, zodat zij de dakelementen verticaal vanaf de trailer direct op het caso kunnen aanbrengen.

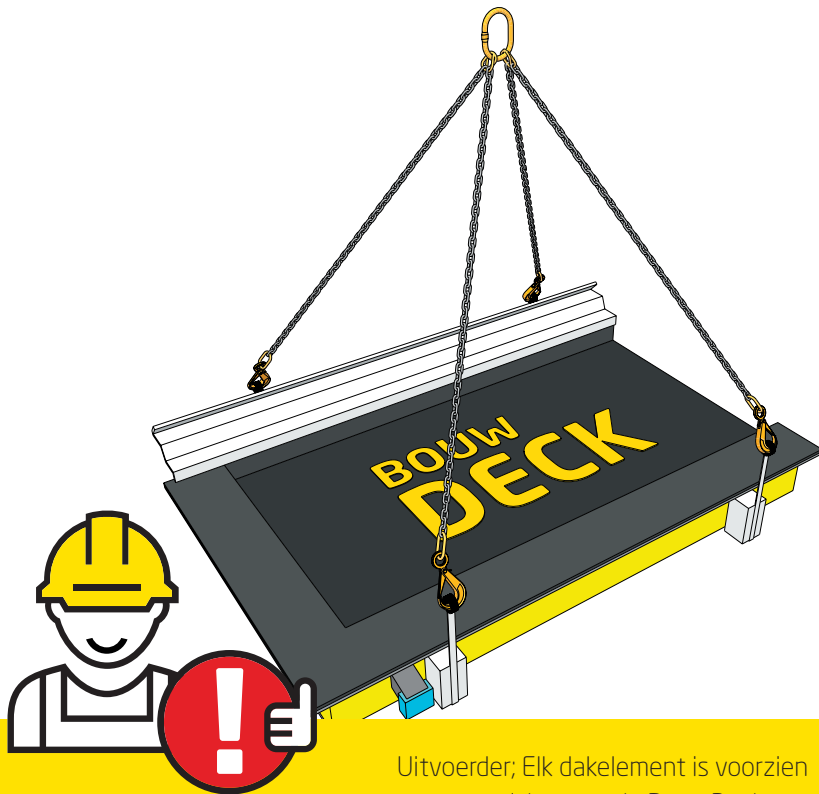


Hijsvoorschriften voor de dak- elementen

Uitvoerder; Elk dakelement is voorzien van een sticker met de BouwDeck hijsvoorschriften, het is belangrijk dat deze voorschriften worden nageleefd.



Bouwdeck hijsvoorschriften

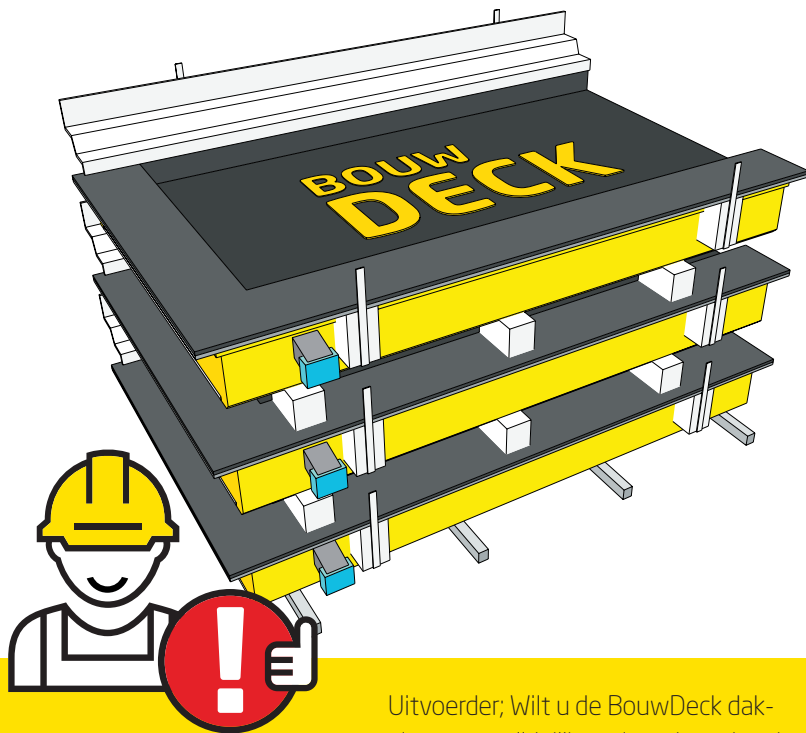


Het opslaan van de dak- elementen

Uitvoerder; Wilt u de BouwDeck dak-
elementen tijdelijk opslaan, lees dan de
sticker met de BouwDeck hijsvoorschrif-
ten die op elk dakelement is geplaatst.




Bouwdeck hijsvoorschriften

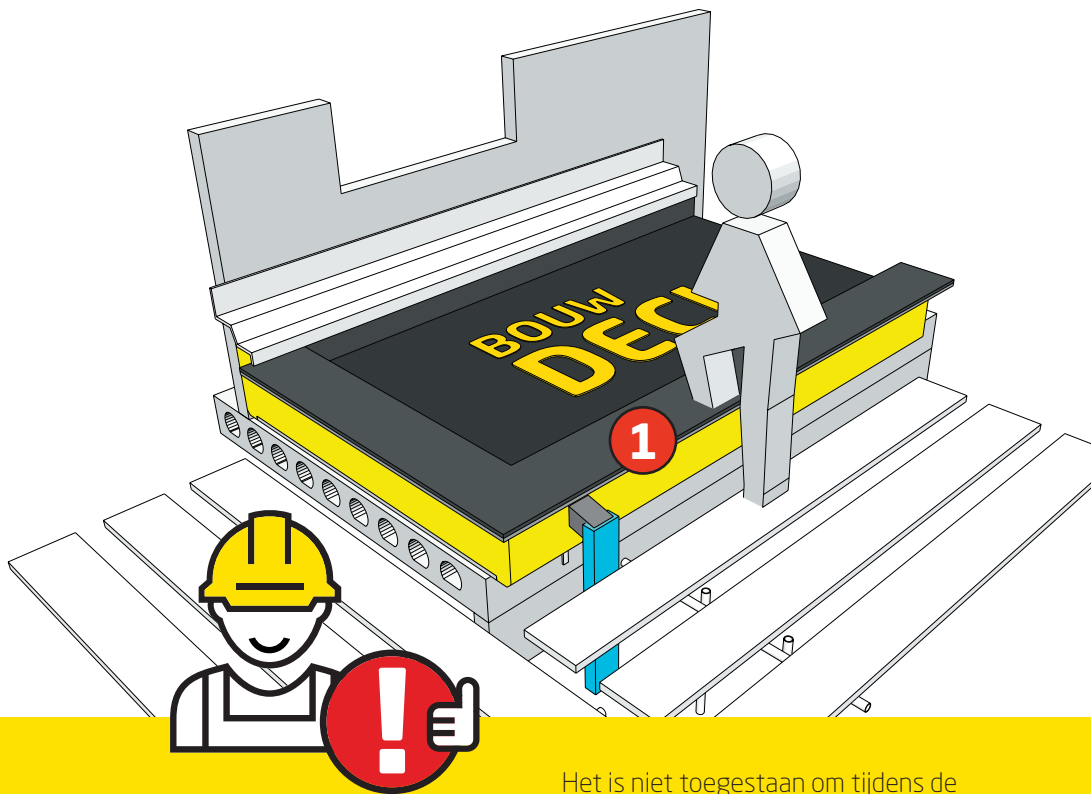


Voorkom belasting van de muurafdekker

Het is niet toegestaan om tijdens de bouw op de muurafdekker **1** van het dakelement te steunen, te staan of op andere wijze te belasten. De muurafdekker kan pas belast worden als de gemetselde buitenmuur op hoogte is.

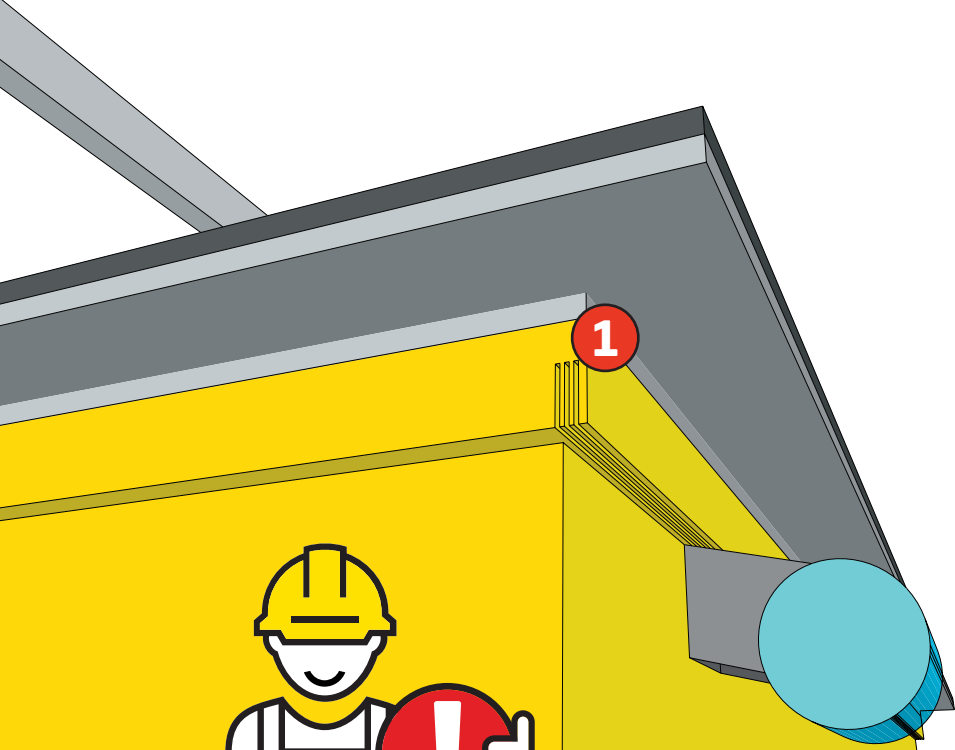

Verwijder de neus van het dakelement niet


Het neusje **1** aan de Dakstand met 3 insnijdingen mag nooit in het geheel verwijderd worden. Om de stelruimte deels te corrigeren mag er daar waar nodig 1 of 2 cm. weggesneden worden.

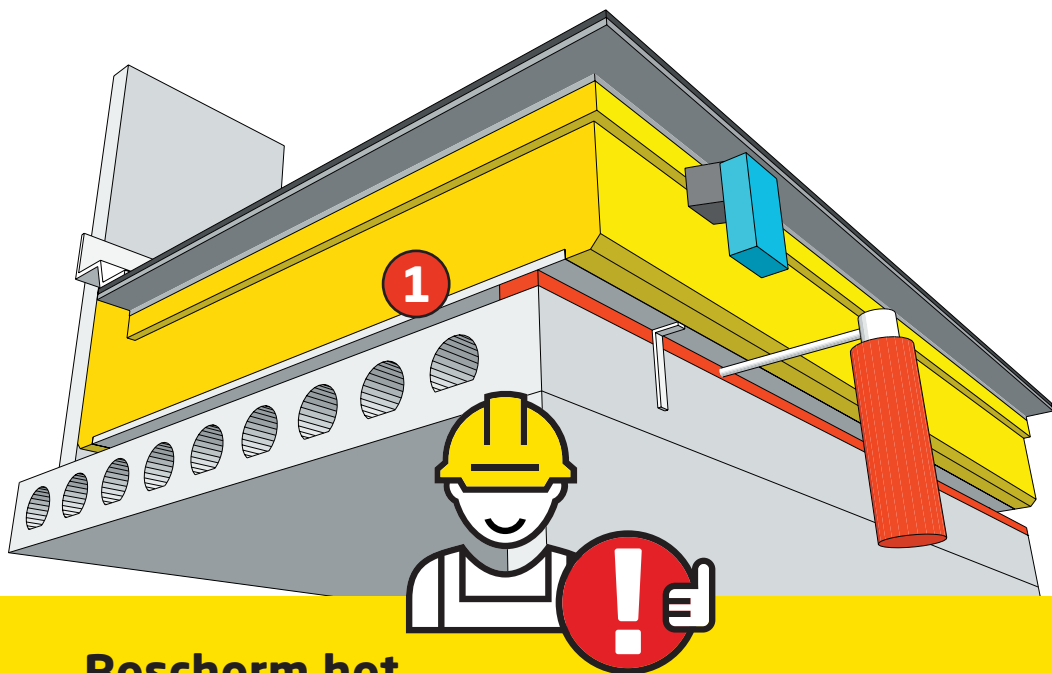

Bescherm het dakelement tegen optrekkend vocht

Montageploeg; Bij vochtige weersomstandigheden is het advies om de voorzijde van het dakelement nog niet

luchtdicht af te werken maar pas bij droge weersomstandigheden af te dichten met Flexpur **1** (flexibele pur-schuim). Hierdoor kan het vocht in de onderconstructie tussen het dakelement volledig uitdampen.

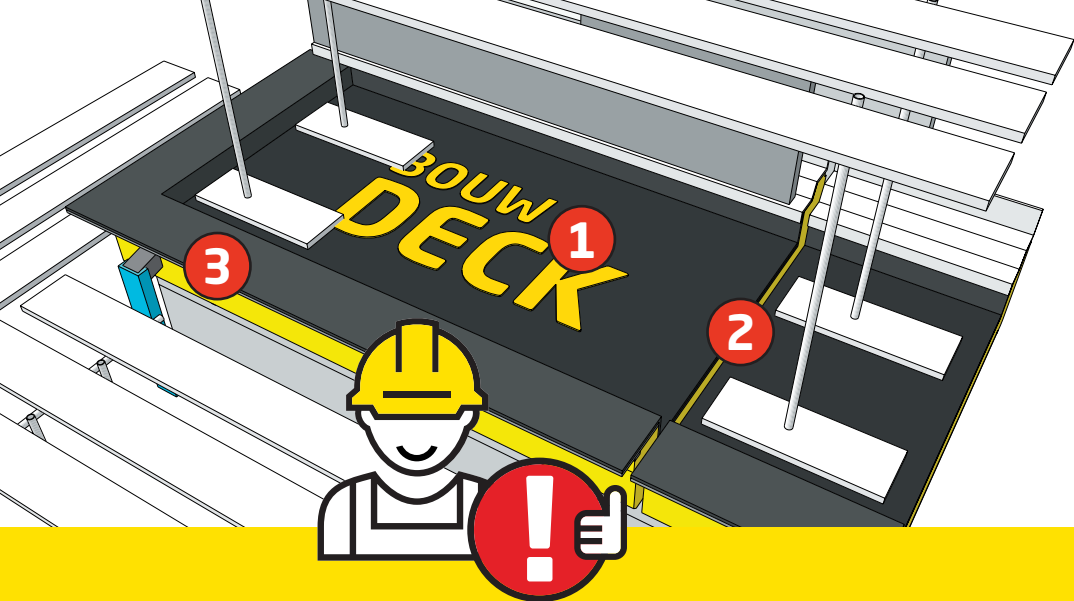


Plaatsen van de steiger op het dakelement

Steigerbouwer; Controleer goed voor het plaatsen van de steiger of de aangebrachte BouwDeck beschermmatten **1** nog op de juiste plaats liggen en dat de naden **2** tussen de dakelementen waterdicht door BouwDeck is afge-

werkt. Plaats nooit een steigerdeel op de verbinding als deze nog niet waterdicht is afgewerkt! De steiger mag nooit op de dakrand **3** steunen!

Het koppelen van de BouwDeck dakelementen kan door weersomstandigheden een aantal dagen duren. BouwDeck streeft ernaar om de naden waterdicht binnen 1 of 2 dagen afgewerkt te hebben.

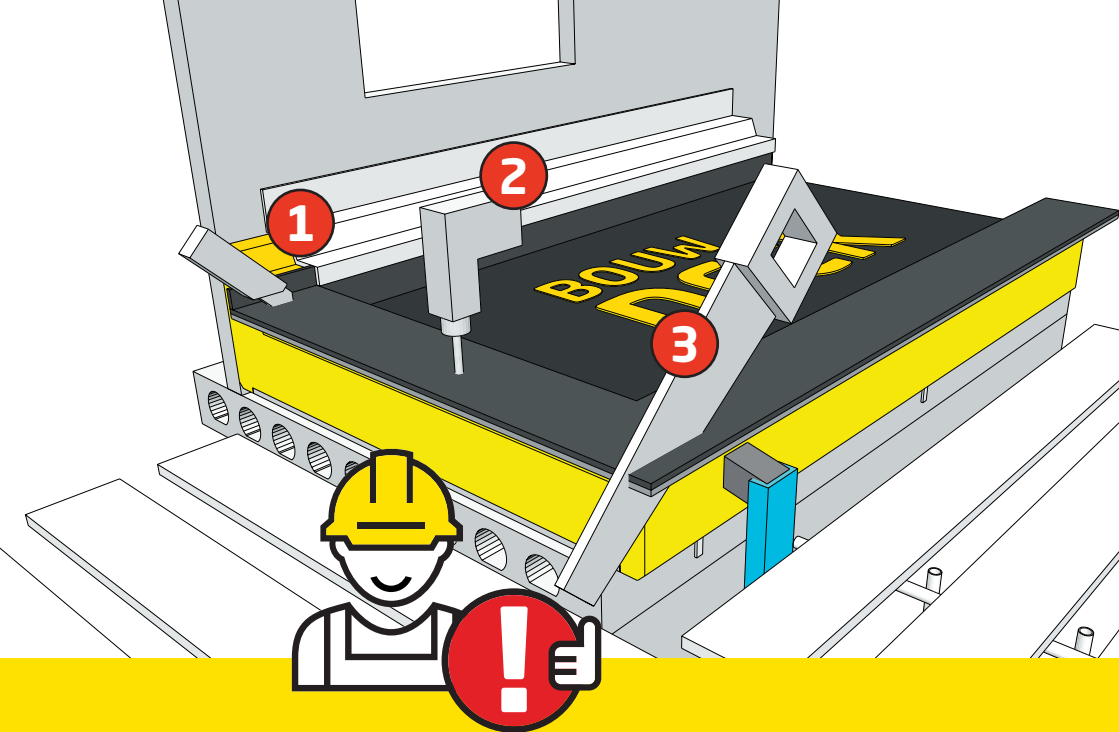


Voorkom schade aan het dakelement

Stelleur/metselaar; Het insnijden **1**, schroeven **2**, het inzagen van

muurplaten **3** levert schade aan de BouwDeck dakelementen op.

Eventuele aanpassingen aan de BouwDeck dakelementen mogen uitsluitend in overleg met BouwDeck worden uitgevoerd.

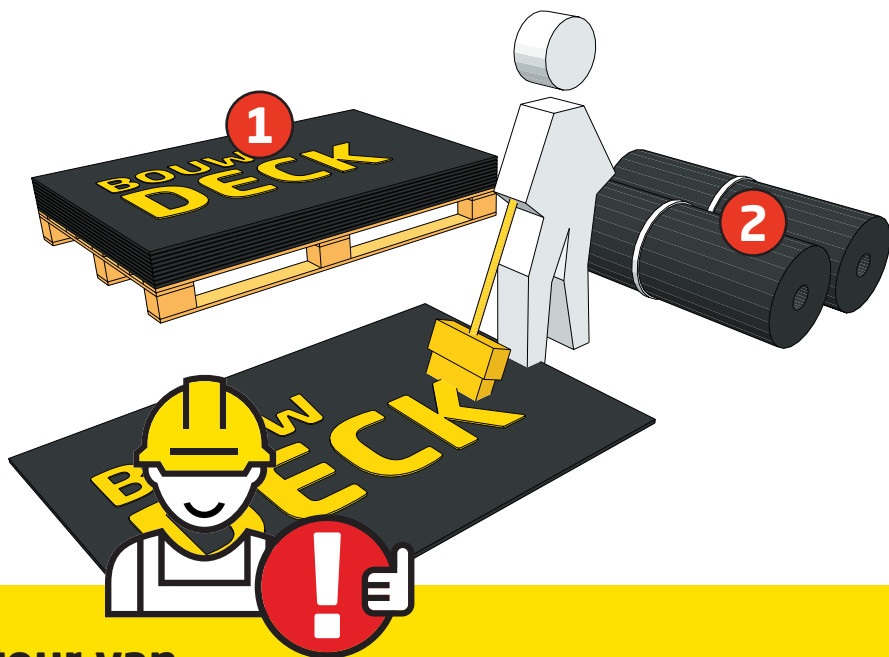


Retour van de BouwDeck beschermmatten

Uitvoerder; De rubberen beschermmatten komen wij na de bouwactiviteiten geheel kostenlos op de bouwplaats ophalen. Zorg er wel voor dat de

rubberen beschermmatten schoon, en onbeschadigd op een pallet **1** of opgerold **2** klaar liggen voor transport.


Bij verlies of schade zullen wij dit met de te verstrekken credit verrekenen. De kosten hiervan zijn € 39,75 voor een smalle beschermmat en € 49,75 voor een brede beschermmat.

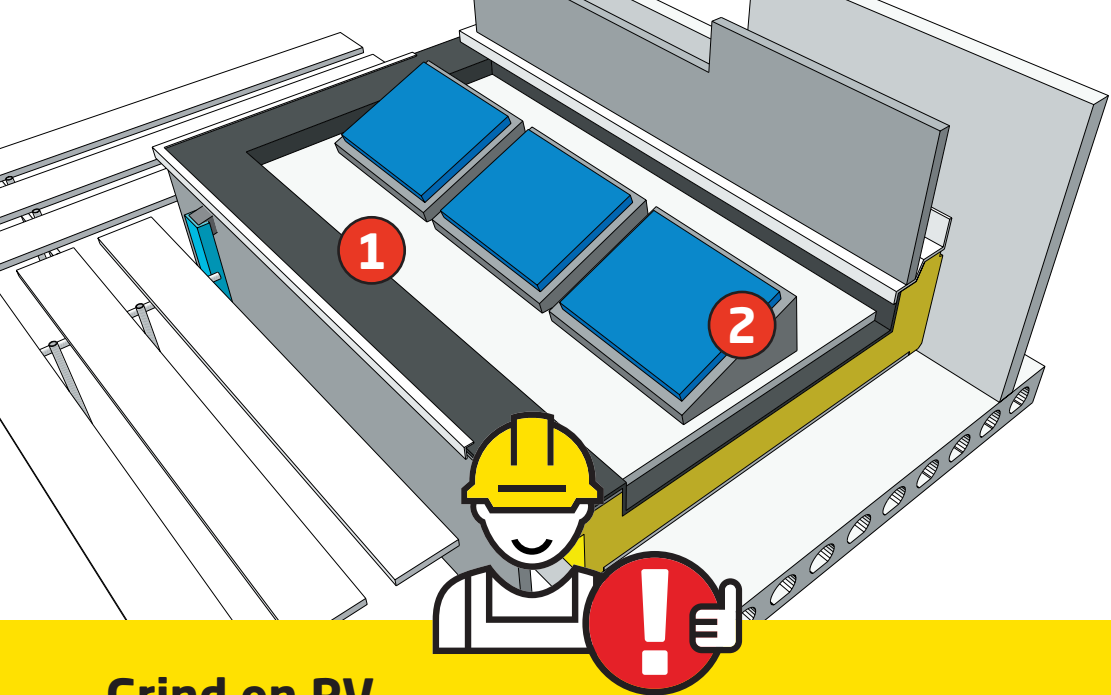

Grind en PV-panels op het dakelement

Uitvoerder; Minimaal 3 weken voor het laten zakken van de steiger tot aan de eerste slag is het noodzakelijk dat er contact wordt opgenomen met

BouwDeck voor het afroepen en het aanbrengen van het grind **1**. Worden de dakelementen voorzien van zonnepanelen **2** dan is het zaak dat de frames, voordat het grind wordt aangebracht, geplaatst worden. Daarna kunnen de PV-panelen aangebracht worden.

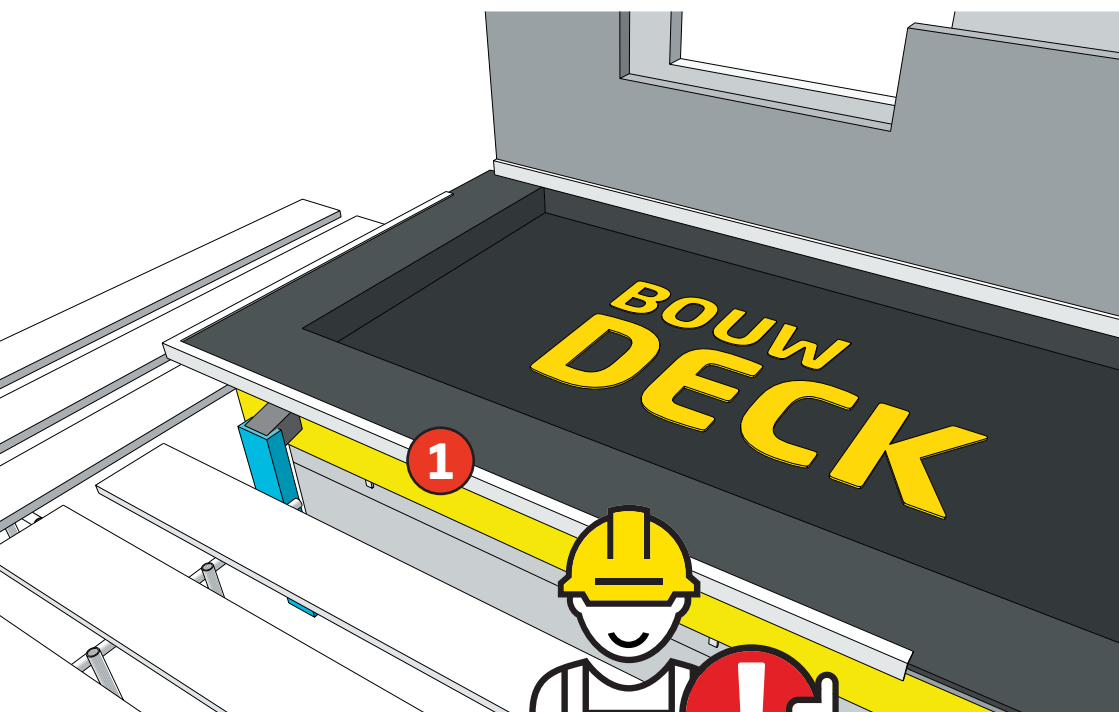

Het aanbrengen van de daktrim

Uitvoerder; Het is noodzakelijk dat minimaal 3 weken voor het laten zakken van de steiger tot de eerste slag

contact opgenomen wordt met BouwDeck voor het afroepen en het veilig aanbrengen van de daktrimmen **1**.

PREFAB DAKSYSTEMEN

BOUW DECK



Dick de BouwDecker

BouwDeck

Strijkviertel 15 Unit 7

3454 PH De Meern

030 - 307 91 50

info@bouwdeck.nl

bouwdeck.nl

bouwdeck.nl

